

薛城区 2022 年度新冠肺炎疫情防控物资储备 项目支出绩效评价报告

委托单位：薛城区财政局

主管部门：薛城区疾病预防控制中心

评价机构：华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司

评价时间：2023年08月

目 录

摘要	1
正文	8
一、项目基本情况	8
（一）项目立项	8
（二）项目预算	9
（三）项目计划实施内容	10
（四）项目组织管理	10
二、项目绩效目标	11
（一）项目总目标	11
（二）年度绩效目标	11
三、评价基本情况	12
（一）评价目的	12
（二）评价对象和范围	12
（三）评价依据	13
（四）评价原则、评价方法	13
（五）绩效评价指标体系	15
（六）评价人员构成及分工	16
（七）绩效评价工作过程	17
四、结论评价及分析	19
（一）综合结论评价	19
（二）非现场评价情况分析	21
（三）现场评价情况分析	22
五、绩效评价指标分析	22
（一）项目决策情况	22
（二）项目过程情况	25
（三）项目产出情况	28
（四）项目效益情况	30
六、主要经验及做法	32

七、存在的问题及原因分析	33
（一）绩效目标描述不明确，部分绩效指标未能通过清晰可衡量的指标值予以体现	33
（二）对于疫情防控物资使用的监管不到位	33
八、有关建议	33
（一）强化绩效目标管理理念，规范绩效目标编制	33
（二）按照相关管理制度规范应急物资的出入库记录	33
九、附件	34
附件一：绩效评价得分表	35
附件二：调查问卷及统计分析	46
附件三：问题清单	48

摘要

为进一步规范和提升项目实施及财政资金使用效益，受薛城区财政局委托，我司围绕薛城区新冠肺炎疫情防控物资储备项目的预算资金的申请、使用及项目实施的产出及效益等，从决策、过程、产出、效益四个方面构建了项目支出绩效评价指标体系，衡量预算资金的管理是否规范、项目实施是否达到了预期效益，并根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件结合比较法、公众评判法等评价方法对薛城区新冠肺炎疫情防控物资储备项目开展绩效评价工作。

本项目用于购买开展应检尽检人员和全员核酸检测所需试剂、实验室耗材等物资以及急需的专用设备购置，保障核酸检测物资供应，确保疫情防控工作顺利开展。

本次绩效评价采用比较法、公众评判法等方法，发现本项目实施存在以下几个问题：①绩效目标描述不明确，部分绩效指标未能通过清晰可衡量的指标值予以体现；②对于疫情防控物资使用的监管不到位。综合评价得分93分，等级为“优”，具体评价报告内容如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

自2019年新冠肺炎疫情暴发以来，疫情传播时常反复，未能得到有效控制，2022年疫情再次暴发。鉴于当前疫情防控形势，按照相关要求，经区疫情防控指挥部研究决定，储备全员核

酸检测、应检尽检、校园全员及每天10%抽检、应急车辆购买等应急物资。

通过新冠肺炎疫情防控物资储备项目的实施，保障疫情期间应检尽检、全员核酸检测、应急车辆购买等应急物资供应，确保疫情防控工作的顺利开展。

（二）项目预算安排和支出情况

新冠肺炎疫情防控物资储备项目2022年预算资金为1410.00万元，实际到位资金1410.00万元。

购买核酸试剂耗材花费919.48万元，购买核酸检测读卡器花费77.94万元，购买方舱实验室装备花费300.00万元，购买救护车花费26.50万元，共计1323.91万元。

由于后期疫情防控物资购置由薛城区应急管理局、粮食和物资储备中心等负责，预算调整为1323.91万元。

（三）项目主要内容和实施情况

用于购买开展应检尽检人员和全员核酸检测所需试剂、实验室耗材等物资以及急需的专用设备购置，保障核酸检测物资供应，确保疫情防控工作顺利开展。

二、项目绩效目标

（一）项目总体绩效目标

由于新冠肺炎疫情加剧，储备应检尽检、全员核酸检测、校园全员及每天10%学生抽检、应急车辆购买等应急物资，保障核酸检测物资供应，确保疫情防控工作的顺利开展。

（二）项目年度绩效目标

2022 年度计划疫情防控物资储备完成率达到 100%，物资储备质量达标率达到 100%，物资储备在规定时间内完成，及时率达到 100%，物资储备控制在预算金额内，保障全员核酸、应检尽检物资供应，持续推进疫情防控工作。

三、 评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过了解新冠肺炎疫情防控物资储备项目核酸检测耗材、实验室设备等物资储备情况，判断物资储备项目实际开展情况，进一步提高资金使用的精准性和有效性，保障薛城区群众的传染病防控安全性，也为主管部门决策提供参考。

2. 评价对象

绩效评价对象为薛城区 2022 年度新冠肺炎疫情防控物资储备项目 1323.91 万元资金的使用绩效。

3. 评价范围

绩效评价范围薛城区整个区域。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学规范、绩效相关、公开透明。

2. 指标体系

本项目指标体系由4个一级指标，12个二级指标，18个三级指标组成。评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据逻辑分析思想，按决策—过程—产出一效益的逻辑顺序，将评价指标体系设计为决策、过程、产出和效益四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

3. 评价方法

通过前期现场调研，本次绩效评价受益对象主要为薛城区群众，根据对新冠肺炎疫情防控物资储备项目的预算、实施等具体情况的考虑，宜采用比较法、公众评判法等方法进行绩效评价，系统科学的反映绩效评价综合绩效情况。

4. 评价标准

本项目根据项目特点以及政策法规、行业标准设置各项指标的评分标准以及指标标准值评分标准的设定做到量化、可操作。

（三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作以《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）为准则，同时结合项目特点，参照《全区新冠肺炎疫情防控工作会议纪要》等文件要求实施。评价工作分为前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交绩效评价报告五个阶段。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

评价组在《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）提出的绩效评价指标框架基础上，经过数据采集、现场调研、实地考察、访谈以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。按照权重指标体系，综合评分，本项目最终得分93分，评价结果为“优”。具体评分情况如表4.1所示：

表 4.1 项目得分汇总表

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	18	16	30	29	93

（二）绩效分析

1. 决策指标

项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目立项程序规范，按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。项目绩效目标描述过于简单，部分绩效指标无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算编制经过科学论证，额度测算依据充足。

2. 项目过程

项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规，管理制度健全，制定了项目资金监管相关规定或制度。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；对于疫情防控物资的领用出库监管不到位，未有出库相关记录；项目实施单位资料齐全；项目实施信息、条件落实到位。

3. 项目产出

项目主要是储备疫情防控所需物资、设备等，保障全员核酸检测、应检尽检等需求。产出数量方面，疫情防控物资储备完成率达到 100%。产出质量方面，物资储备质量达标率达到 100%。产出时效方面，物资储备完成时间符合规定，物资储备完成及时率达到 100%。产出成本方面，物资储备花费金额控制在预算范围内。

4. 项目效益

根据现场调研及对薛城区群众问卷调查，项目效益明显，全员核酸检测、应检尽检所需物资得到保障，疫情防控工作得到有效推进，防范了疫情形势的加剧，群众满意度较高。

五、项目存在问题及原因分析

（一）绩效目标描述不明确，部分绩效指标未能通过清晰可衡量的指标值予以体现

根据实施单位薛城区疾病预防控制中心提供的绩效目标申报表、自评表，绩效目标“新冠肺炎常态化防控”描述过于简单，未能交代清楚项目具体内容和实施目的，效益指标“巩固疫情防

控成果”、“确保应检尽检，全员核酸检测任务的完成”未能总结为指标名称，指标值为“是”未能通过清晰可衡量的指标值予以体现。

（二）对于疫情防控物资使用的监管不到位

根据实施单位薛城区疾病预防控制中心提供的应急物资出入库登记表，对于储备的核酸检测耗材物资仅有到货入库登记，物资领用出库未有日期、用途、数量、领用人等记录，对于疫情防控储备物资的使用监管不到位。

六、意见和建议

（一）强化绩效目标管理理念，规范绩效目标编制

建议实施单位应强化绩效目标管理理念，落实绩效目标管理制度。按照要求编制绩效目标申报表，设置科学、完整的绩效目标，将目标细化、量化为清晰、明确的绩效指标，规范绩效指标的名称描述，通过可衡量的指标值予以体现。

（二）按照相关管理制度规范应急物资的出入库记录

建议实施单位在今后的应急物资出入库记录过程中，在应急物资到货后及时进行验收入库记录，在领用物资时对于出库日期、用途、数量、领用人等信息做好记录，了解物资使用情况及去向，做好对于应急物资的使用监管工作。

正文

为进一步规范和提升项目实施及财政资金使用效益，受薛城区财政局委托，我司围绕薛城区新冠肺炎疫情防控物资储备项目的预算资金的申请、使用及项目实施的产出及效益等，从决策、过程、产出、效益四个方面构建了项目支出绩效评价指标体系，衡量预算资金的管理是否规范、项目实施是否达到了预期效益，并根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件结合比较法、公众评判法等评价方法对薛城区新冠肺炎疫情防控物资储备项目开展绩效评价工作。

本项目用于购买开展应检尽检人员和全员核酸检测所需试剂、实验室耗材等物资以及急需的专用设备购置，保障核酸检测物资供应，确保疫情防控工作顺利开展。

本次绩效评价采用比较法、公众评判法等方法，发现本项目实施存在以下几个问题：①绩效目标描述不明确，部分绩效指标未能通过清晰可衡量的指标值予以体现；②对于疫情防控物资使用的监管不到位。综合评价得分93分，等级为“优”，具体评价报告内容如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 项目立项的环境和条件

自2019年新冠肺炎疫情暴发以来，疫情传播时常反复，未能得到有效控制，2022年疫情再次暴发。鉴于当前疫情防控形

势，按照相关要求，经区疫情防控指挥部研究决定，储备全员核酸检测、应检尽检、校园全员及每天10%抽检、应急车辆购买等应急物资。

2. 实施项目达到的目标和意义

通过新冠肺炎疫情防控物资储备项目的实施，保障疫情期间应检尽检、全员核酸检测、应急车辆购买等应急物资供应，确保疫情防控工作的顺利开展。

3. 项目立项依据

(1) 《全区新冠肺炎疫情防控工作会议纪要》

(二) 项目预算

1. 资金投入情况

新冠肺炎疫情防控物资储备项目2022年预算资金为1410.00万元，实际到位资金1410.00万元。

2. 资金使用情况

购买核酸试剂耗材花费919.48万元，购买核酸检测读卡器花费77.94万元，购买方舱实验室装备花费300.00万元，购买救护车花费26.50万元，共计1323.91万元。

3. 预算变更及变更原因

由于后期疫情防控物资购置由薛城区应急管理局、粮食和物资储备中心等负责，预算调整为1323.91万元。

4. 资金来源

项目预算金额1410.00万元，均为薛城区区级资金。

（三）项目计划实施内容

1. 项目立项时间

本项目立项时间为 2022 年。

2. 批复单位

本项目批复单位为薛城区人民政府。

3. 项目具体内容

用于购买开展应检尽检人员和全员核酸检测所需试剂、实验室耗材等物资以及急需的专用设备购置，保障核酸检测物资供应，确保疫情防控工作顺利开展。

4. 项目所在区域

本项目所在区域为薛城区整个区域。

5. 项目计划完成时间

本项目计划完成时间为 2022 年 1 月-2022 年 12 月。

（四）项目组织管理

1. 项目主管部门及职责

本项目主管单位和实施单位均为薛城区疾病预防控制中心，负责储备全员核酸检测、应检尽检、校园全员及每天 10%抽检、应急车辆购买等应急物资。

2. 项目组织管理架构及实施流程

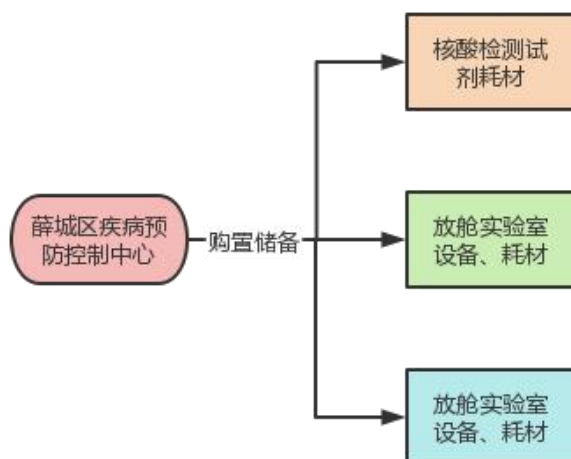


图 1-1 项目组织管理架构及实施流程图

3. 资金拨付流程




图 1-2 资金拨付流程图

二、项目绩效目标

（一）项目总目标

由于新冠肺炎疫情加剧，储备应检尽检、全员核酸检测、校园全员及每天 10% 学生抽检、应急车辆购买等应急物资，保障核酸检测物资供应，确保疫情防控工作的顺利开展。

（二）年度绩效目标

2022 年度计划疫情防控物资储备完成率达到 100%，物资储

备质量达标率达到 100%，物资储备在规定时间内完成，及时率达到 100%，物资储备控制在预算金额内，保障全员核酸、应检尽检物资供应，持续推进疫情防控工作。

表 2-1 薛城区新冠肺炎疫情防控物资储备项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	疫情防控物资储备完成率	100%
	质量指标	物资储备质量达标率	100%
	时效指标	物资储备完成及时率	100%
	成本指标	物资储备控制金额	≤1410 万元
效益指标	社会效益指标	全员核酸检测、应检尽检物资保障率	100%
	可持续影响指标	疫情防控工作推进程度	持续推进
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过了解新冠肺炎疫情防控物资储备项目核酸检测耗材、实验室设备等物资储备情况，判断物资储备项目实际开展情况，进一步提高资金使用的精准性和有效性，保障薛城区群众的传染病防控安全性，也为主管部门决策提供参考。

（二）评价对象和范围

绩效评价对象为薛城区 2022 年度新冠肺炎疫情防控物资储

备项目 1323.91 万元资金的使用绩效。

绩效评价范围薛城区整个区域。

（三）评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
（中发〔2018〕34号）

（2）《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理指导意见》（财预〔2021〕6号）

（3）《关于配合做好区财政重点绩效评价工作的通知》（薛财绩〔2023〕3号）

（4）《关于下达 2022 年新冠肺炎疫情防控资金预算指标的通知》（薛财社指〔2022〕19号）

（5）《全区新冠肺炎疫情防控工作会议纪要》

（6）疾控中心管理制度等

（7）项目绩效目标申报表、自评表等

（8）资金使用台账、拨付凭证、合同文件等

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

本次绩效评价指标按照以下原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明。绩效评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

2. 评价方法

通过前期现场调研，本次绩效评价受益对象主要为薛城区群众，根据对新冠肺炎疫情防控物资储备项目的预算、实施等具体情况的考虑，宜采用比较法、公众评判法等方法进行绩效评价，系统科学的反映绩效评价综合绩效情况。

(1) 比较法

比较法是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

本次绩效评价通过比较新冠肺炎疫情防控物资储备项目的实际完成情况与绩效目标，判断项目实施是否达到了预期，产生了应有的效益。

(2) 公众评判法

公众评判法是通过公众意见调查、专家评审来间接推断特定项目活动效果的一种最重要的绩效评价方法。采用公众评判法有利于从多方面检验组织开展特定项目活动的效果。公众评判法通过调查研究公众的反映、行业专家意见，从而确认特定工作在影响目标公众的认知、态度、观点和行为等方面的效果。

本次绩效评价主要是通过对薛城区群众进行问卷调查。对薛城区群众的问卷调查主要是了解疫情期间核酸检测是否能及时开展，是否能满足全员核酸检测物资需求，是否真正达到了项目

实施的预期效益。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标设计思路

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据逻辑分析思想，按“决策—过程—产出一效果”的逻辑顺序，为考核薛城区新冠肺炎疫情防控物资储备项目的立项、资金申请及使用是否符合相关规定，项目实施是否达到预期效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及项目具体内容，将绩效评价指标体系设计为“决策”“过程”“产出”和“效果”四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

2. 评价标准

本次绩效评价按照财政预算资金的分配方式特点，特确定以下评价标准。

（1）计划标准。以项目预先制定的目标、计划、预算等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。参照行业指标数据。

3. 指标权重

由于新冠肺炎疫情防控物资储备项目其产出、效益比较突出，故产出、效益指标权重设置占比相对较高。具体权重如下：

决策指标权重 20%：决策主要考察项目立项、绩效目标、资金投入情况，故在决策指标设置权重占比 20%。

过程指标权重 20%:过程主要考察本项目资金管理情况、组织实施情况,由于资金管理、组织实施对项目实施有一定的影响,故在项目过程指标权重设置占比 20%。

产出指标权重 30%:本次绩效评价主要是对疫情防控物资储备情况及物资储备达标率、完成及时率进行评价,故在项目产出设置权重 30%。

效益指标权重 30%:本项目通过社会效益、可持续影响、满意度来评价项目实施产生的效益,效益较明显,设置权重 30%。

4. 数据来源、证据收集方式

本项目数据来源是通过资料收集、现场访谈、现场调研、问卷调查等方式从薛城区疾病预防控制中心及薛城区群众获得。

(六) 评价人员构成及分工

为本次绩效评价我司成立了专门的评价组,确定一名负责人,负责绩效评价工作的总体控制,为确保绩效评价工作的客观、公正、严谨,配备了工程、财务等方面人员。具体评价组人员名单如下:

表 3-1 绩效评价组工作人员

序号	姓名	职务	专业	技术职称
1	袁诗昌	报告撰写人	会计	中级会计师
2	王聪	技术经理	经济学	中级会计师
3	王丽艳	技术经理	会计	中级会计师
4	庄乾敏	技术总监	工程造价	咨询工程师

表 6.2 绩效评价组工作职责表

组内职务	职责
项目负责人	撰写绩效评价报告；与相关部门、绩效管理专家、项目管理者沟通确保绩效评价报告初稿符合委托方要求，符合绩效评价机构文本质量要求；审定绩效评价报告。
技术总监	编写绩效评价方案，协调绩效评价小组工作，指导绩效评价小组理解绩效评价任务要求，组织实施绩效评价活动；分析绩效评价数据，指导修订绩效评价报告。
技术经理	组织实施现场绩效评价工作，协助分析、汇总绩效评价数据、整理工作底稿。

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在项目实施单位提供评价所需材料的基础上，对所有项目资料进行书面（非现场）评审。本次绩效评价组织实施过程共分为五个阶段，包括前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写。

1. 前期准备

前期准备阶段的工作主要包括接受委托任务、成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、编制社会调查方案、设计资料清单、制定评价实施方案、评价方案论证与沟通等流程。

2. 组织实施

了解项目实施的总体情况，提出现场绩效评价意见。对主管部门报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，并根据区

财政局规定的现场绩效评价抽取范围规模，提出现场绩效评价的具体抽取意见，报财政局审核同意后组织现场绩效评价。

3. 非现场评价

评价组对所搜集获取到的所有项目实施单位相关文件资料进行了全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成了非现场评价的结果。

4. 现场评价

（1）资料核查

评价组通过查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

（2）现场座谈会

通过组织现场座谈会的方式与薛城区疾病预防控制中心的工作人员进行面谈，了解项目在实施过程中的过程管理情况和项目实施结果和效益。

5. 综合分析

（1）评价组在对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成了最终的评价结果。项目具体评价打分情况见附件一所示。

（2）根据评分结果，绩效评价工作组按照实施方案拟定的综合评分对项目进行了评级，本项目设计分值为 100 分，综合得分在 90-100 分（含 90 分）以上为“优”（成效显著）；综合得分在 80—90 分（含 80 分）为“良”（成效明显）；综合得分在

60-80分（含60分）为“中”（成效一般）；综合得分在60分以下为“差”（成效较差）。

6. 评价报告撰写

（1）撰写报告。评价组按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

（2）提交报告。评价报告初稿撰写完成后，与薛城区疾病预防控制中心就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。我公司参考项目相关单位意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各单位书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交薛城区财政局。

（3）归集档案

需要存档的文件（包括但不限于）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、专家组评审意见、绩效评价报告等。档案由专人管理，分类分科整理，编制目录清单，集中妥善保管，严格执行档案使用登记制度，签字确认责任到人，纸质档案资料保存期限为5年。

四、结论评价及分析

（一）综合结论评价

在评价组制定的评价指标体系及评分标准基础上，通过数据

采集、问卷调查及访谈，对薛城区 2022 年度新冠肺炎疫情防控物资储备项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 93 分，评价等级为“优”。其中，决策类指标标准分为 20 分，得分为 18 分，得分率为 90.00%；过程类指标标准分为 20 分，得分为 16 分，得分率为 80.00%；产出类指标标准分为 30 分，得分 30 分，得分率 100.00%；效益类指标标准分为 30 分，得分为 29 分，得分率为 96.67%。具体评分情况如下表所示：

各部分指标得分率如下图 4-1 所示：

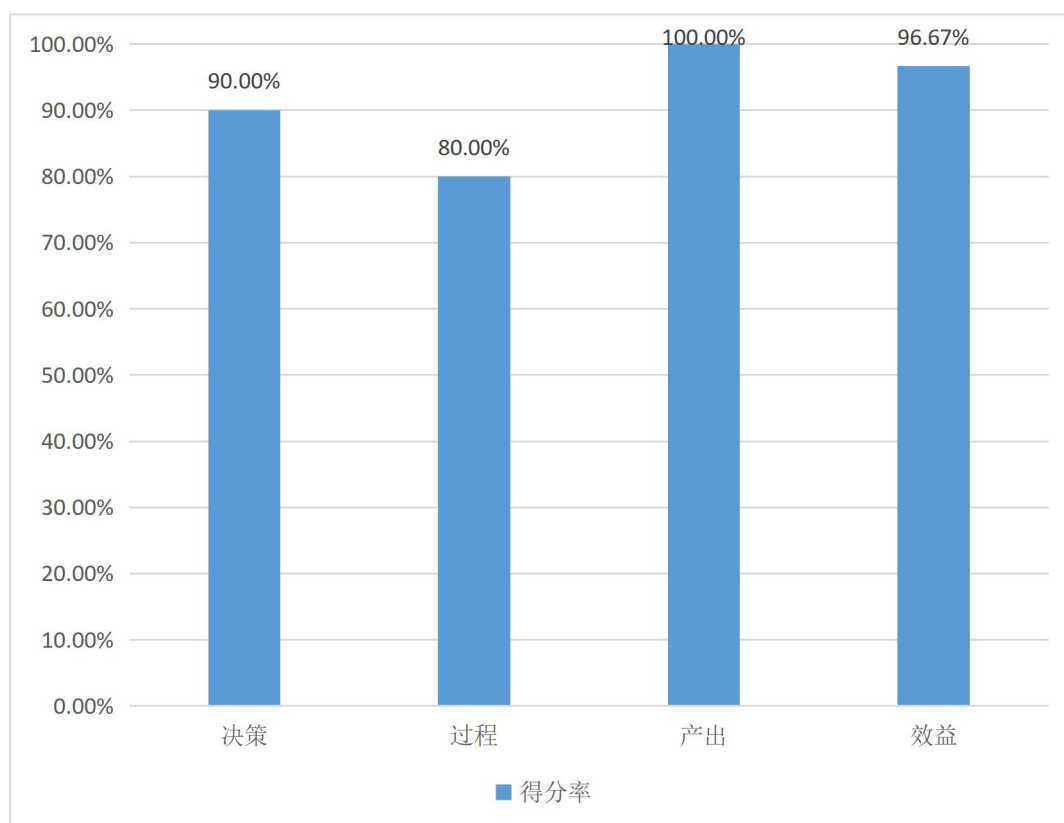


图 4-1 项目绩效评价得分率柱状图

表 4.1 项目绩效评价得分汇总表

一级指标	标准分	得分值	得分率
决策	20	18	90.00%
过程	20	16	80.00%
产出	30	30	100.00%
效益	30	29	96.67%
总分	100	93	93.00%

（二）非现场评价情况分析

绩效评价工作组通过被评价项目单位薛城区疾病预防控制中心提供的项目相关资料，包括立项程序、预算执行情况、资金审批、财务管理制度、业务管理制度、项目实施过程、项目会议纪要等资料，结合查阅、检索的各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，对项目进行非现场评价情况分析。

本项目财政预算资金为 1410 元，调整后预算资金为 1323.91 万元，实际到位资金 1323.91 万元，项目 2022 年实际财政支出 1323.91 万元。项目立项依据充分、立项程序规范，资金审批符合制度要求。

本项目资金拨付流程由薛城区疾病预防控制中心提交项目资金申请预算，经区财政审核并批准拨付项目资金，疾病预防控制中心根据合同要求拨付资金。

（三）现场评价情况分析

根据评价组现场调研，项目的实施产出达到预期效果，但实施过程存在一定的提升空间，现场情况总结如下：

①绩效目标描述不明确，部分绩效指标未能通过清晰可衡量的指标值予以体现；

②对于疫情防控物资使用的监管不到位。

五、绩效评价指标分析

依据本项目绩效评价指标体系，分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行。具体情况如下：

（一）项目决策情况

决策类指标总分 20 分，得分 18 分，项目立项依据充分、立项程序规范，资金审批符合制度要求；项目有绩效目标，但目标描述过于简单，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

决策指标下设 3 个二级指标，6 个三级指标。其中二级指标为项目立项指标、绩效目标指标和资金投入指标。项目立项下设项目立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标；绩效目标下设绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标；资金投入下设预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。

表 5.1 决策类指标得分汇总表

二级指标	标准分	得分	得分率
项目立项	6	6	100.00%
绩效目标	8	6	75.00%

资金投入	6	6	100.00%
------	---	---	---------

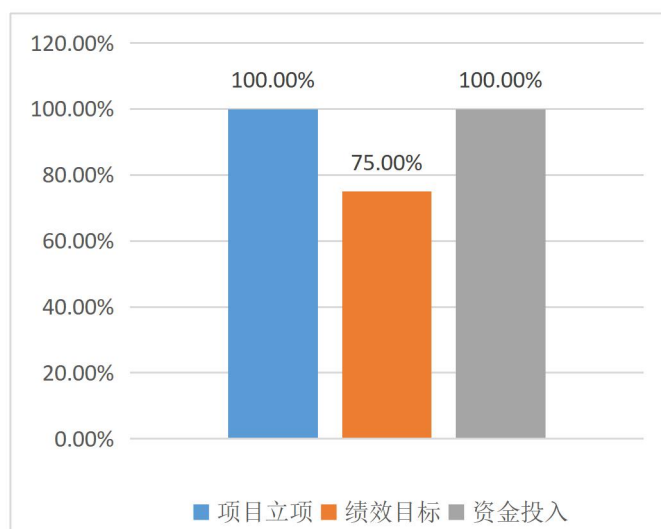


图 5-1 决策类指标得分柱状图

各分项指标得分和绩效分析如下：

1. 项目立项（指标分值 6 分，得分 6 分）

该指标包含立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标，主要用以反映项目立项的依据是否充分及立项程序的合规性。

（1）立项依据充分性（指标分值 3 分，得分 3 分）

根据现场调研，本项目立项依据《全区新冠肺炎疫情防控工作会议纪要》等文件要求，结合薛城区疫情形象及防控需要，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项符合薛城区住房保障工作实际；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重

复。依据评分标准，本项指标得分为 3 分。

（2）立项程序规范性（指标分值 3 分，得分 3 分）

根据现场调研，本项目的立项经过薛城区人民政府签批，按照规定的程序申请设立；项目审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的集体决策。依据评分标准，本项指标得分为 3 分。

2. 绩效目标（指标分值 8 分，得分 6 分）

该指标包括绩效目标合理性和绩效指标明确性 2 个三级指标，绩效目标合理性和绩效指标明确性，主要用以反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

（1）绩效目标合理性（指标分值 4 分，得分 3 分）

根据现场调研及绩效目标申报表、自评表，项目有绩效目标，但项目绩效目标描述过于简单，仅为“新冠肺炎疫情常态化防控”一句话，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。依据评分标准，本项指标扣 1 分，得分为 3 分。

（2）绩效指标明确性（指标分值 4 分，得分 3 分）

根据现场调研及绩效目标申报表、自评表，本项目有绩效目标，绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但部分绩效指标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，例如效益指标“巩固疫情防控成果”指标值

为是。依据评分标准，本项指标扣1分，得分为3分。

3. 资金投入（指标分值6分，得分6分）

该指标包括预算编制科学性、资金分配合理性2个三级指标，主要用以反映预算安排和工作计划的匹配性；重点工作资金的保障性，项目是否遵循轻重缓急按序保障；资金的筹集及分配是否按照政策合理分配。

（1）预算编制科学性（指标分值3分，得分3分）

根据现场调研及绩效目标批复表，本项目预算内容包括购买核酸检测耗材、应急车辆、方舱实验室设备等，与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算编制经过科学论证，额度测算依据充足。依据评分标准，本项指标得分为3分。

（2）资金分配合理性（指标分值3分，得分3分）

根据现场调研及项目资金台账，本项目预算资金分配根据疫情防控形势和实际需要，储备所需的耗材、设备，分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。依据评分标准，本项指标得分为3分。

（二）项目过程情况

过程类指标总分20分，得分16分，项目资金到位率100%，执行率100%。资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、

虚列支出等情况。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，未有项目实施相关工作总结等，物资使用监管不到位。

过程类指标下设 2 个二级指标，5 个三级指标。其中二级指标为资金管理、组织实施指标。资金管理下设资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标；组织实施下设管理制度健全性、制度执行有效性 2 个三级指标。

表 5.2 过程类指标得分汇总表

二级指标	标准分	得分	得分率
资金管理	10	10	100%
组织实施	10	6	60%

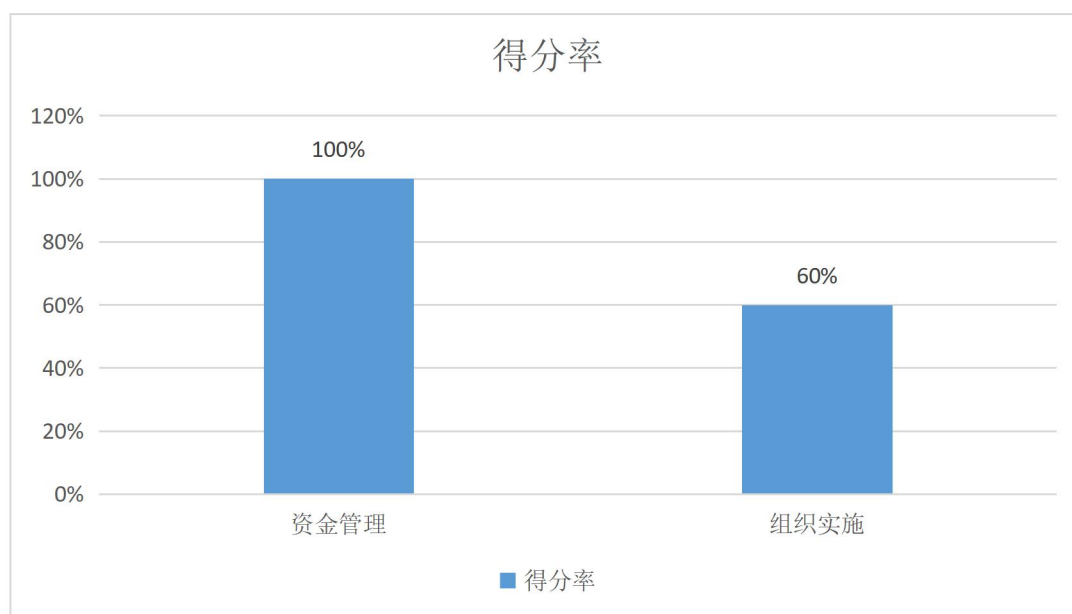


图 5-2 过程类指标得分柱状图

1. 资金管理（指标分值 10 分，得分 10 分）

该指标包含资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标，主要用以反映项目资金管理情况。

(1) 资金到位率 (指标分值 4 分, 得分 4 分)

根据现场调研及资金台账, 本项目资金到位率 $= (1323.91 \text{ 万元} / 1323.91 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ 。依据评分标准, 本项指标得分为 4 分。

(2) 预算执行率 (指标分值 4 分, 得分 4 分)

根据现场调研及资金支出明细, 本项目预算执行率 $= (1323.91 \text{ 万元} / 1323.91 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ 。依据评分标准, 本项指标得分为 4 分。

(3) 资金使用合规性 (指标分值 2 分, 得分 2 分)

根据现场调研及资金支出凭证, 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 符合项目预算批复或合同规定的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准, 本项指标得分为 2 分。

2. 组织实施 (指标分值 10 分, 得分 6 分)

该指标包括管理制度健全性和制度执行有效性 2 个三级指标, 主要用以反映项目在实施过程中是否合规、制度是否健全。

(1) 管理制度健全性 (指标分值 4 分, 得分 4 分)

根据现场调研, 项目实施单位有《薛城区疾控中心财务管理制度》、《薛城区疾控中心差旅费报销制度》等制度, 具有相应的财务管理制度和业务管理制度, 财务和业务管理制度合法、合规。依据评分标准, 本项指标得 4 分。

（2）制度执行有效性（指标分值 6 分，得分 2 分）

根据现场调研，项目实施遵守相关法律法规和部门相关管理规定，由于后期疫情防控物资储备相关工作换为粮食和物资储备中心、应急管理局等部门负责，预算调整为 1323.91 万元；由于疫情原因特殊性，防控物资分批次到位，仅有物资验收入库记录，未有相关领用出库记录。依据评分标准，本项指标扣 4 分，得分为 2 分。

（三）项目产出情况

产出类指标总分 30 分，得分 30 分。产出指标下设 4 个二级指标，4 个三级指标。其中二级指标为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标。产出数量指标包括疫情防控物资储备完成率 1 个三级指标；产出质量指标包括物资储备质量达标率 1 个三级指标；产出时效指标包括物资储备完成及时率 1 个三级指标；产出成本指标包括物资储备控制金额 1 个三级指标。

表 5.3 产出类指标得分汇总表

二级指标	标准分	得分	得分率
产出数量	8	8	100%
产出质量	8	8	100%
产出时效	7	7	100%
产出成本	7	7	100%

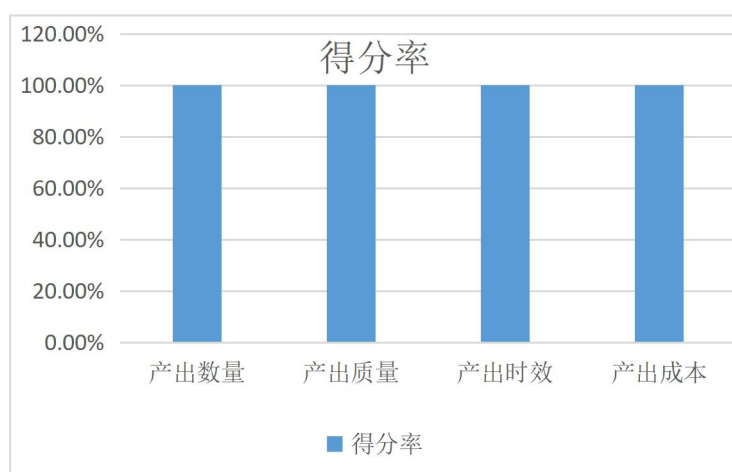


图 5-3 产出类指标得分柱状图

1. 产出数量（指标分值 8 分，得分 8 分）

本项指标包括疫情防控物资储备完成率 1 个三级指标，主要用以反映项目完成情况。

（1）疫情防控物资储备完成率（指标分值 8 分，得分 8 分）

根据现场调研及资金支出台账、物资验收入库记录，疫情防控物资储备工作均已完成，未影响疫情防控工作推进。依据评分标准，本项指标得分为 8 分。

2. 产出质量（指标分值 8 分，得分 8 分）

本项指标包括物资储备质量达标率 1 个三级指标，主要用以反映本项目完成的质量情况。

（1）物资储备质量达标率（指标分值 8 分，得分 8 分）

根据现场调研及物资验收入库记录，所储备的核酸检测耗材、方舱实验室设备等未出现质量问题，物资储备质量达标率达到 100%。依据评分标准，本项指标得分为 8 分。

3. 产出时效（指标分值 7 分，得 7 分）

本项指标包括物资储备完成及时率 1 个三级指标，主要用以反映本项目的产出的及时性。

（1）物资储备完成及时率（指标分值 7 分，得 7 分）

根据现场调研及案卷研究，核酸检测耗材、方舱实验室设备等物资到位及时，未耽误疫情防控工作推进。根据评分标准，本项指标得分为 7 分。

4. 产出成本（指标分值 7 分，得 7 分）

本项指标包括物资储备控制金额 1 个三级指标，主要用以反映本项目的产出成本的节约情况。

（1）物资储备控制金额（指标分值 7 分，得 7 分）

根据现场调研及项目资金台账、支出凭证等，疫情防控物资储备共计支出 1323.91 万元，控制在预算范围内。根据评分标准，本项指标得分为 7 分。

（四）项目效益情况

效益指标总分 30 分，得 29 分。项目实施社会效益明显，保障了全员核酸检测、应检尽检物资供应，推进了疫情防控工作开展，防范了疫情的传播，通过对薛城区群众问卷调查满意度较高。

效益指标下设 3 个二级指标，3 个三级指标。其中二级指标为社会效益、可持续影响、满意度 3 个二级指标。社会效益指标下设全员核酸检测、应检尽检物资保障率 1 个三级指标；可持续影响下设疫情防控工作推进程度 1 个三级指标；满意度指标下设

群众满意度 1 个三级指标。

表 5.4 效益类指标得分汇总表

二级指标	标准分	得分	得分率
社会效益	10	10	100.00%
可持续影响	10	10	100.00%
满意度	10	9	90.00%

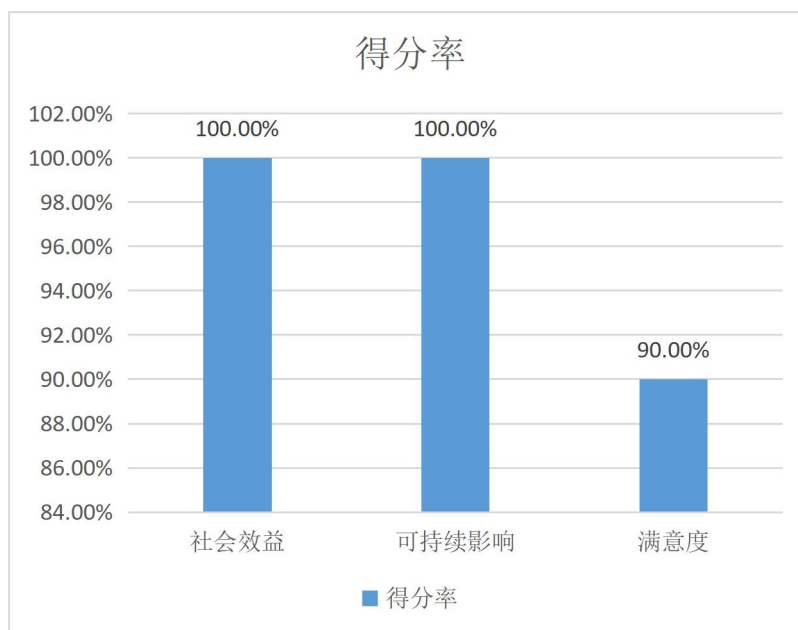


图 5-4 效益类指标得分柱状图

1. 社会效益（指标分值 10 分，得 10 分）

该指标包括全员核酸检测、应检尽检物资保障率 1 个三级指标，主要用以反映项目的社会效益。

（1）全员核酸检测、应检尽检物资保障率（指标分值 10 分，得 10 分）

根据现场调研及对薛城区群众的问卷调查，通过项目实施能保证全员核酸检测、应检尽检的物资供应，未耽误疫情防控工作

的开展，全员核酸检测、应检尽检物资保障率达到 100%。依据评分标准，本项指标得分为 10 分。

2. 可持续影响（指标分值 10 分，得 10 分）

该指标包括疫情防控工作推进程度 1 个三级指标，主要用以反映本项目的可持续影响。

（1）疫情防控工作推进程度（指标分值 10 分，得 10 分）

通过对薛城区群众问卷调查及相关部门工作人员座谈，通过项目实施推进了疫情防控工作的开展，对防范疫情传播起到了明显的促进作用。依据评分标准，本项指标得分为 10 分。

3. 满意度（指标分值 10 分，得 9 分）

该指标包含群众满意度 1 个三级指标，主要用以反映薛城区群众对项目实施效果的满意程度。

（1）群众满意度（指标分值 10 分，得 9 分）

通过对薛城区群众问卷调查以及运用加权平均数计算。群众满意度为 93%。依据满意度 $\geq 95\%$ 得 10 分，每减少 1% 扣 0.5 分的评分标准，本项指标扣 1 分，得分为 9 分。

六、主要经验及做法

通过新冠肺炎疫情防控物资储备项目实施，提前储备了全员核酸检测、应检尽检、方舱实验室设备等应急物资，能充分应对疫情形势的变化，满足薛城区居民及相关部门应对疫情所需的各种疫情物资，有利于推进疫情防控工作的开展。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标描述不明确，部分绩效指标未能通过清晰可衡量的指标值予以体现

根据实施单位薛城区疾病预防控制中心提供的绩效目标申报表、自评表，绩效目标“新冠肺炎常态化防控”描述过于简单，未能交代清楚项目具体内容和实施目的，效益指标“巩固疫情防控成果”、“确保应检尽检，全员核酸检测任务的完成”未能总结为指标名称，指标值为“是”未能通过清晰可衡量的指标值予以体现。

（二）对于疫情防控物资使用的监管不到位

根据实施单位薛城区疾病预防控制中心提供的应急物资出入库登记表，对于储备的核酸检测耗材物资仅有到货入库登记，物资领用出库未有日期、用途、数量、领用人等记录，对于疫情防控储备物资的使用监管不到位。

八、有关建议

（一）强化绩效目标管理理念，规范绩效目标编制

建议实施单位应强化绩效目标管理理念，落实绩效目标管理制度。按照要求编制绩效目标申报表，设置科学、完整的绩效目标，将目标细化、量化为清晰、明确的绩效指标，规范绩效指标的名称描述，通过可衡量的指标值予以体现。

（二）按照相关管理制度规范应急物资的出入库记录

建议实施单位在今后的应急物资出入库记录过程中，在应急

物资到货后及时进行验收入库记录，在领用物资时对于出库日期、用途、数量、领用人等信息做好记录，了解物资使用情况及去向，做好对于应急物资的使用监管工作。

九、附件

附件一：绩效评价得分表

附件二：调查问卷及统计分析

附件三：问题清单

附件一：绩效评价得分表

薛城区 2022 年度新冠肺炎疫情防控物资储备项目绩效评价指标体系

一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
决 策 (20 分)	项目立 项 (6 分)	立项依据 充分性(3 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	(1) 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分; (2) 项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分; (3) 项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得 0.5 分; (4) 项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分; (5) 项目与相关部门同类项目或部门内部相	3	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求;与部门职责范围相符,属于部门履职所需;属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	现 场 调 研、案卷 研究	现 场 调 研、案卷 研究

一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
				关项目不重复得 0.5 分。				
		立项程序 规范性（3 分）	项目申请、设立过 程是否符合相关 要求，用以反映和 考核项目立项的 规范情况。	（1）项目按照规定的程序申请设立得 1 分； （2）项目审批文件、材料符合相关要求得 1 分； （3）事前已经过必要的可行性研究、专家论 证、风险评估、绩效评估、集体决策得 1 分。	3	项目按照规定的程序申请设立；审批文 件、材料符合相关要求；事前经过必要 的集体决策。	现 场 调 研、案卷 研究	现 场 调 研、案卷 研究
	绩效目 标 （ 8 分）	绩效目标 合理性（4 分）	项目所设定的绩 效目标是否依据 充分，是否符合客 观实际，用以反映 和考核项目绩效	（1）项目有绩效目标得 1 分； （2）项目绩效目标与实际工作内容具有相关 性得 1 分； （3）项目预期产出效益和效果符合正常的业 绩水平得 1 分；	3	项目有绩效目标，绩效目标描述过于简 单；项目预期产出效益和效果符合正常 的业绩水平；与预算确定的项目投资额 或资金量相匹配。	现 场 调 研、案卷 研究	现 场 调 研、案卷 研究

一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
			目标与项目实施的相符情况。	(4) 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 1 分。				
		绩效指标明确性(4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	(1) 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 2 分; (2) 通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分; (3) 与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分。	3	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;部分指标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现;绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。	现场调研、案卷研究	现场调研、案卷研究
	资金投入 (6)	预算编制科学性(3)	项目预算编制是否经过科学论证、	(1) 预算编制经过科学论证得 1 分; (2) 预算内容与项目内容匹配得 1 分;	3	预算内容与项目内容匹配,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹	现场调研、案卷	现场调研、案卷

一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
	分)	分)	有明确标准，资金 额度与年度目标 是否相适应，用以 反映和考核项目 预算编制的科学 性、合理性情况。	(3) 预算额度测算依据充分，按照标准编制 得 0.5 分； (4) 预算确定的项目投资额或资金量与工作 任务相匹配得 0.5 分。		配，预算编制经过科学论证，额度测算 依据充足。	研究	研究
		资金分配 合理性(3 分)	项目预算资金分 配是否有测算依 据，与项目单位或 地方实际是否相 适应，用以反映和	(1) 预算资金分配依据充分得 1 分； (2) 资金分配额度合理，与项目单位或地方 实际相适应得 2 分。	3	预算资金分配依据充分且资金分配额 度合理。	现 场 调 研、案卷 研究	现 场 调 研、案卷 研究

一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
			考核项目预算资 金分配的科学性、 合理性情况。					
过 程 (20 分)	资金管 理 (10 分)	资金到位 率 (4分)	实际到位资金与 预算资金的比率, 用以反映和考核 资金落实情况对 项目实施的总体 保障程度。	资金到位率等于 100%得 4 分, 不足 100%以实 际资金到位率*4 分计算分值。	4	资金到位率=(1323.91 万元/1323.91 万 元)×100%=100%。	财务转账 记录	现 场 调 研、案卷 研究
		预算执行 率 (4分)	项目预算资金是 否按照计划执行,	预算执行率在 90%-110% (含 90%及 110%) 内得 4 分, 每低于或高于一个百分点, 扣 0.4 分,	4	预算执行率=(1323.91 万元/1323.91 万 元)×100%=100%。	财务转账 记录	现 场 调 研、案卷

一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
			用以反映或考核项目预算执行情况。	扣完为止。				研究
		资金使用合规性（2分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	（1）符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 0.5 分； （2）资金的拨付有完整的审批程序和手续得 0.5 分； （3）符合项目预算批复或合同规定的用途得 1 分； （4）如存在截留、挤占、挪用、虚列支出等任何一种情况，本指标不得分；	2	资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	现场调研、案卷研究	现场调研、案卷研究

一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
				若项目 20%以上资金存在上述问题，则二级指标整体不得分。				
	组织实 施（10 分）	管理制度 健全性（4 分）	项目实施单位的 财务和业务管理 制度是否健全,用 以反映和考核财 务和业务管理制 度对项目顺利实 施的保障情况。	（1）已制定或具有相应的财务和业务管理制 度得 2 分； （2）财务和业务管理制度合法、合规、完整 得 2 分。	4	项目实施单位制定或具有相应的财务 管理制度；具有业务管理制度；财务和 业务管理制度合法、合规；有项目资金 相关监管制度。	财务和业 务管理制 度	现 场 调 研、案卷 研究
		制度执行 有效性（6 分）	项目实施是否符 合相关管理规定，	（1）遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分；	2	项目实施遵守相关法律法规和相关管 理规定；项目未有调整及支出调整；未	财务和业 务管理制	现 场 调 研、案卷

一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
		分)	用以反映和考核 相关管理制度的 有效执行情况。	(2) 项目调整及支出调整手续完备得 1 分； (3) 项目合同书、实施单位考勤记录、对实 施单位考核等资料齐全并及时归档得 3 分； (4) 项目实施的人员条件、场地设备、信息 支撑等落实到位得 1 分。		有项目实施相关工作总结等；物资使用 监管不到位。	度	研究
产出 (30 分)	产出数 量 (8 分)	疫情防控 物资储备 完成率 (8 分)	疫情防控物资储 备工作完成情况， 用以反映和考核 项目数量目标的 实现程度。	实际疫情防控物资储备完成率达到 100%，得 8 分，每少 1%扣 0.5 分，扣完为止。	8	疫情防控物资储备完成率达到 100%	现 场 调 研、案卷 研究	现 场 调 研、案卷 研究
	产出质	物资储备	实际储备的疫情	物资储备质量达标率达到 100%，得 8 分；否则	8	物资储备质量达标率 100%	现 场 调	现 场 调

一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
	量（8 分）	质量达标 率（8分）	防控物资质量是否达到标准，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	不得分。			研、案卷 研究	研、案卷 研究
	产出时 效（7 分）	物资储备 完成及时 率（7分）	疫情防控物资储备是否依据要求按时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	疫情防控物资储备在规定时间内完成，得7分； 每晚1个月扣2分，扣完为止。	7	能在规定时间内完成防控物资储备，完成及时率100%	现 场 调 研、案卷 研究	现 场 调 研、案卷 研究

一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
	产出成 本（7 分）	物资储备 控制金额 （7分）	疫情防控物资储备是否控制在预算金额内，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。	物资储备金额控制在 1410 万元内，得 7 分； 每增加 1 万元扣 0.5 分，扣完为止。	7	实际花费金额 1323.91 万元	现 场 调 研、案卷 研究	现 场 调 研、案卷 研究
效益 （30 分）	社会效 益（10 分）	全员核酸 检测、应 检尽检物 资保障率 （10分）	项目实施对保障 全员核酸检测、应 检尽检物资供应 所带来的直接或 间接影响情况。	全员核酸检测、应检尽检物资保障率达到 100% 得 10 分，每减少 1%，扣 0.5 分，扣完为止。	10	全员核酸检测、应检尽检物资均能得到 保障，保障率达到 100%	现 场 调 研、问卷 调查	现 场 调 研、问卷 调查

一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
	可持续 影响 (10 分)	疫情防控 工作推进 程度(10 分)	项目实施后对推 进疫情防控工作 发挥的可持续影 响情况。	疫情防控工作推进程度相关问题得分率 $\geq 95\%$ 得10分，每减少1%，扣0.5分，扣完为止。	10	得分率100%	现 场 调 研、问卷 调查	现 场 调 研、问卷 调查
	满意度 (10 分)	群众满意 度(10分)	薛城区群众对项 目实施效果的满 意程度。	群众满意度 $\geq 95\%$ 得10分，每减少1%，扣0.5 分，扣完为止。	9	满意度93%	现 场 调 研、问卷 调查	现 场 调 研、问卷 调查
合计					93			

附件二：调查问卷及统计分析

薛城区 2022 年度新冠肺炎疫情防控物资储备项目
服务对象满意度、知晓度调查问卷

您好！

根据薛城区财政局相关规定要求，我公司现开展 2022 年度新冠肺炎疫情防控物资储备项目绩效评价工作，为全面了解项目情况以及服务对象的满意程度，特开展本次问卷调查，您的意见非常重要，感谢您的支持与配合！填写说明：除特别说明可多选的题目外，其他问题只选一个选项，请您在相应选项前的口打“√”。

1、请问 2022 年疫情期间您是否在薛城区？

选项	小计	比例
是	100	100%
否	0	0%
本题有效填写人次	100	

2、请问疫情期间的核酸检测是否能按照规定进行？

选项	小计	比例
是	100	100%
否	0	0%
本题有效填写人次	100	

3、您认为疫情防控物资的储备对推进疫情防控工作有帮助吗？

选项	小计	比例
非常有帮助	100	100%
有帮助	0	0%
一般	0	0%
帮助不大	0	0%
没有帮助	0	0%
本题有效填写人次	100	

4、请问您疾控中心工作人员服务是否满意？

选项	小计	比例
非常满意	93	93%
比较满意	7	7%
不太满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	100	

5、请问您认为对于突发传染病的防控工作是否存在不足？
无

附件三：问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目决策存在的问题	1	绩效目标描述不明确,部分绩效指标未能通过清晰可衡量的指标值予以体现	薛城区疾病预防控制中心
	2		
			
项目过程存在的问题	1	对于疫情防控物资使用的监管不到位	薛城区疾病预防控制中心
	2		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
			
备 注:			
